# Resolución de Gerencia Municipal

**N° 55 -2023-GM-MDAA-T**

Alto de la Alianza, 09 MAR 2023

**VISTOS:**

El **PROVEÍDO N° 1716-2023-GM-MDAA** de fecha 09 de marzo 2023, emitido por el GERENTE MUNICIPAL, el Informe N° 041-2023-RNNV-RO-RRDCDAPRAYCDASSUAUSPDAAPTT-SGOM-GDU/MDAA-T de fecha 01 de marzo 2023, quien solicita aprobación el expediente de **Ampliación de Plazo N° 03** de la "IOARR: **RENOVACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO DE LA ASOCIACIÓN URBANIZADORA SAN PEDRO, DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA", con CUI Nº 2527333,** Informe N° 0270-2023-SGOM-GDU-MDAA-TACNA de fecha 02 de marzo 2023, Informe N° 440-2023- GDU-MDAA-TACNA de fecha 02 de marzo 2023; Informe N° 030-2023-LCJI-IO-SGSLI-GM/MDAA de fecha 07 de marzo 2023, Informe N° 275-2023-DLQ-SGSLI-GM-MDAA/TACNA de fecha 07 de marzo 2023, Informe N° 140-2023-GAJ-MDAA de fecha 08 de marzo 2023; y,

**CONSIDERANDO:**

Que, de conformidad al artículo 194° de la Constitución Política del Perú y el Art. II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, "Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia y esta autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico";

Que, conforme al **artículo 26° de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades**, la administración municipal se basa en "***principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control recurrente y posterior, rigiéndose por los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficiencia, eficacia, participación y seguridad ciudadana***";

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del artículo 20°, concordante con lo dispuesto en el artículo 43° de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de **dictar Resoluciones de Alcaldía** y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo; Sin embargo, conforme lo previsto en el **artículo 85° del TUO de la Ley N° 27444** "Ley del Procedimiento Administrativo General" **le permite desconcentrar competencias en los órganos jerárquicamente dependientes de dicha Alcaldía**;

Que, mediante la **Resolución de Alcaldía N° 09-2023 – MDAA-T, de fecha 02 de enero de 2023**, en su Artículo Primero se resuelve DELEGAR al GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZA las funciones, atribuciones administrativas de gestión y facultades resolutivas administrativas, quedando establecidas las siguientes materias: Las atribuciones administrativas establecidas en los **numerales N° 3, 7, 9, 11, 15 19, 23, 25, 33,** del artículo 20 de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidad, siendo que en el numeral 2.3 indica: **"Aprobar las ampliaciones y/o reprogramaciones de plazos y actividades"** (El subrayado es nuestro);

Que, debe precisarse que la Administración Pública rige su actuación bajo el **Principio de Legalidad**, recogido en el **numeral 1.1) del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444,** que dispone que "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas".

Que, mediante la **Resolución de Gerencia Municipal Nº 244-2020-GM-MDAA-TACNA de fecha 30 de diciembre del 2020** se aprobó la **Directiva Nº 07-2020-A-MDAA/T** ejecución de obras públicas en la modalidad de ejecución presupuestaria directa, se ha contemplado en el **numeral 6.5 De las Modificaciones presupuestales al Expediente Técnico, numeral 6.5.5** "La ampliación de plazo se otorgará por causales justificadas, se otorgará si la causal modifique la Ruta Crítica del Cronograma de la Ejecución. Se reconocerá la prórroga obtenida a partir de la nueva ruta crítica. Establece como causales lo siguiente: *(a) Demora por desabastecimiento de materiales y/o insumos u otros casos fortuitos, sustentados, comprobados por el Inspector y/o Supervisor de proyectos. (c)* ***Ejecución de obras o actividades complementarias y/o modificaciones al Expediente Técnico o estudio definitivo aprobado previamente con resolución.*** *(d) Paralizaciones temporales aprobadas de índole social que puedan poner en peligro la integridad física del trabajador, así como la seguridad del proyecto. (e)* ***Paralizaciones temporales por días no trabajados según calendario;***

Que, en el **numeral 6.5 De las Modificaciones presupuestales al Expediente Técnico,** numeral **6.5.5 de la Directiva Nº 07-2020-A-MDAA/T** establece **AMPLIACIÓN DE PLAZO**, precisando lo siguiente: "Las ampliaciones de plazo se otorgarán por **causales justificadas** que hayan alterado la duración de las actividades que gobiernan la ejecución de la obra. **Solo será procedente otorgar ampliación de plazo cuando la causal modifique la ruta crítica del cronograma de ejecución del proyecto de manera que represente demora en la culminación del proyecto**. Se reconocerá la prorroga necesaria obtenida a partir de la **nueva Ruta Crítica**."

Que, mediante la **Resolución de Gerencia Municipal N° 240-2022-GM-MDAA,** con fecha 23 de agosto del 2022, se dispone en artículo primero APROBAR, el Expediente Técnico de la IOARR denominado: "**RENOVACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN, CONEXIONES**

**DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO DE LA ASOCIACIÓN URBANIZADORA SAN PEDRO, DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA", con CUI Nº 2527333,** con un presupuesto total de S/ 1,460,432.75 soles, en un plazo de ejecución de 60 días calendarios, bajo la modalidad de ejecución DIRECTA;

El Expediente Técnico tuvo las siguientes modificaciones: Mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 340-2022-GM-MDAA de fecha de recepción 18 de noviembre del 2022, se resuelve **APROBAR la Ampliación de plazo N° 01** de la IOARR por un plazo de 27 días calendarios; Mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 371-2022-GM-MDAA de fecha de recepción 21 de diciembre del 2022, se resuelve **APROBAR la Ampliación de plazo N° 02** de Obra de la IOARR por un plazo de 19 días calendarios; Mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 365-2022-GM-MDAA de fecha de recepción 15 de Diciembre del 2022, se resuelve **APROBAR el Adicional N° 01 y Deductivo N° 01** de la IOARR por Adicional N° 01 Por Partidas nuevas por la suma de s/+23,141.43 soles y Deductivo Nº 01 por Menores Metrados por la suma de s/.-316,015.13 soles, resultando un presupuesto total modificado a la fecha de s/.1,167,559.05 soles.

Que, para la **dirección técnica y responsabilidad** de la ejecución de la IOARR, han sido designados: (a) Mediante la Resolución de Gerencia Municipal N° 247-2022-GM-MDAA de fecha 24/08/2022, se designa al Ing. JOSMELL ANDRE RETAMOZO FLORES como RESIDENTE de la IOARR, asimismo mediante la Resolución de Gerencia Municipal N° 252-2022-GM-MDAA de fecha 25/08/2022, se designa al Ing. LUIS CARLOS JUCULACA INCACUTIPA como INSPECTOR de la IOARR, mediante la Resolución de Gerencia Municipal N° 10-2023-GM-MDAA-T de fecha de 27/01/2023 se designa con eficacia anticipada al 23 de enero del 2023, al **ING. RENZO NAZARETH NUÑEZ VARGAS** con CIP N.º 165692, como **RESIDENTE de la IOARR**, y mediante la Resolución de Gerencia Municipal N° N° 30-2023-GM-MDAA de fecha de 15/02/2023 se designa con eficacia anticipada al 27 de enero del 2023 al **ING. LUIS CARLOS JUCULACA INCACUTIPA** con CIP N.º 265943, como **INSPECTOR DE OBRA**, respectivamente.

Que, mediante **Resolución de Gerencia Municipal N° 42-2023-GM-MDAA-T** de fecha 23 de febrero del 2023, resuelve en su **ARTICULO PRIMERO APROBAR EL PLAN DE TRABAJO 2023** del proyecto **IOARR** denominado **"RENOVACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO DE LA ASOCIACIÓN URBANIZADORA SAN PEDRO, DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA", con CUI Nº 2527333,** con saldo presupuestal disponible por costo directo y gastos generales de S/. 190,081.02 soles, con plazo de ejecución proyectado de 5 días calendarios, bajo la modalidad por administración directa.

Que, mediante **Resolución de Gerencia Municipal N° 54-2023-GM-MDAA-T** de fecha 08 de marzo del 2023, resuelve en su **ARTICULO PRIMERO APROBAR,** la modificación presupuestal del expediente técnico **ADICIONAL Nº 02 POR PARTIDAS NUEVAS y POR VARIACIÓN DE PRECIOS EN LOS INSUMOS** de la IOARR, adicional Nº 02 por **partidas nuevas por la suma de S/.+184,544.55 soles** y **por variación de precios en los insumos por la suma de S/.+ 57,768.57 soles**, resultando un presupuesto total modificado a la fecha S/.1,409,872.16 soles, bajo la modalidad por administración directa, cuyo expediente técnico y cronograma forman parte de la presente resolución.

Que, con **Informe N° 041-2023-RNNV-RO-RRDCDAPRAYCDASSUAUSPDAAPTT-SGOM-GDU/MDAA-T** de fecha 01 de marzo 2023, emitido por el Residente de Obra ha elaborado y presenta la **AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03** de intervención de la IOARR denominado: "RENOVACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO DE LA ASOCIACIÓN URBANIZADORA SAN PEDRO, DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA", con CUI Nº 2527333 (05 files de 76 folios c/u; y, **Expediente Administrativo de 17 folios),**

Que, del Expediente de **AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03**, en cuanto a la **JUSTIFICACIÓN TÉCNICA**, invoca la siguiente causales: **Ejecución de o actividades complementarios y/o modificaciones al expediente técnico o estudio definitivo aprobado previamente con resolución y Paralizaciones temporales por dias no trabajados según calendario.**

Ahora bien, con respecto a las **causales por Ejecución de o actividades complementarios y/o modificaciones al expediente técnico o estudio definitivo aprobado previamente con resolución y Paralizaciones temporales por días no trabajados según calendario** conforme lo indica el cuaderno de obra en sus **asientos Nº 112 y Nº 113**, justificándose cada uno de las causales para la Ampliación de Plazo.

Asimismo, en el expediente – **JUSTIFICACIÓN Y SUSTENTACIÓN** - precisa que **con respecto a las causales aprobadas:** señala lo siguiente: Mediante "**Asiento Nº 112** del Residente de Obra, del 03 de octubre del 2022:(...) Se pone en conocimiento al Inspector de Obra que se ha dado la realización de la verificación física del presente proyecto se constató que según lo descrito en las partidas ejecutadas por el residente anterior **existe incompatibilidad en campo**, es así, se **pide autorización al inspector para la elaboración y presentación** del **Expediente Ampliación de Plazo N° 03** para la IOARR RENOVACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO DE LA ASOCIACIÓN URBANIZADORA SAN PEDRO, DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA, por las causales antes mencionadas y justificadas." "**Asiento Nº 113** del Inspector de Obra, del 27 de febrero del 2023:(...) En atención a lo indicado por el Residente de Obra en el Asiento Nº 112 se autoriza la elaboración del Expediente Técnico Ampliación de Plazo Nro. 03 por la causal de Paralización y otras vinculantes que estén sustentados técnicamente con la justificación exacta y legal. Su elaboración debe de estar en estricto cumplimiento de los procedimientos, métodos y criterios establecidos

en la Directiva N° 007-2020-GM-MDAA, por lo que se tiene el cuadro resumen que modifica la **RUTA CRITICA** del Cronograma de Ejecución del Proyecto de Inversión, como sigue:

**Cuadro resumen de la Ampliación de Plazo**

| ITEM | ORIGEN | DURACIÓN |
|---|---|---|
| 1 | Tiempo Programado según Expediente Técnico | 60 días |
| **2** | **Ampliación de Plazo N° 01** | **27 días** |
| **3** | **Ampliación de Plazo N° 02** | **19 días** |
| **4** | **Ampliación de Plazo N° 03** | **127 días** |
| **TIEMPO TOTAL INCLUYENDO LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03** | | **233 DÍAS** |

Que, mediante el **Informe N° 0270-2023-SGOM-GDU-MDAA-TACNA** de fecha 02 de marzo 2023, emitido por el Sub Gerente de Obras y Mantenimiento, quien remite el expediente de la Ampliación de Plazo N° 03, sin observaciones e indica que cuenta con los parámetros técnicos exigidos en la directiva N° 007-2020-GM-MDAA, solicita se remita a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Inversiones para su evaluación y aprobación correspondiente.

Que, mediante el **Informe N° 440-2023- GDU-MDAA-TACNA de fecha 02 de marzo 2023**, emitido por el Gerente de Desarrollo Urbano, sin observaciones e indica que el presente expediente se encuentra dentro de los parámetros exigidos en la Directiva N° 07-2020-GM-MDAA.

Que, mediante el Informe N° 030-2023-LCJI- IO- SGSLI-GM/MDAA-TACNA de fecha 07 de marzo del 2023, emitido por el Inspector de Obra, quien concluye en lo siguiente: El Plazo de Ejecución de la IOARR incluyendo el expediente técnico – ampliación DE PLAZO N° 03 – es de 233 días calendarios teniendo como nueva fecha de culminación el 12 de mayo del 2023. La presente solicitud de modificaciones presupuestal no modifica los objetivos principales de la IOARR, además se sujeta a la concepción técnica y el dimensionamiento contenido en la ficha técnica e información registra en el banco de inversiones. Recomienda la aprobación del Expediente Técnico – AMPLIACIÓN DE PLAZO 03 por un plazo de 127 días calendario mediante el Acto Resolutivo y su registro correspondiente, para que de esta manera se pueda cumplir las metas y objetivos trazados en el proyecto original. Así mismo no genera un incremento presupuestal para el proyecto. Finalmente de acuerdo a la evaluación realizada y en virtud a la normativa vigente, esta inspección OPINA, PROCEDENTE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO – ampliación DE PLAZO 03 por 127 días calendario para la IOARR: **"RENOVACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO DE LA ASOCIACIÓN URBANIZADORA SAN PEDRO, DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA", CUI 2527333,** solicitando que derive a la Gerencia Municipal para su aprobación mediante Acto Resolutivo, estableciendo una **NUEVA RUTA CRITICA**, como sigue:

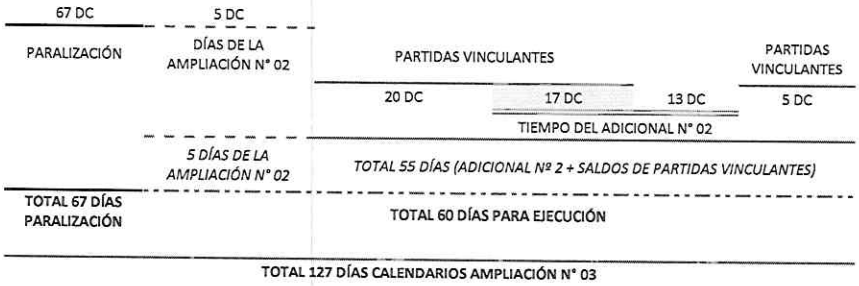


Que, mediante el Informe N° 275-2023-DLQ-SGSLI-GM-MDAA/TACNA de fecha 07 de marzo 2023, emitido por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Inversiones, quien CONCLUYE que considera PROCEDENTE la aprobación de la AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03 de la IOARR: **"RENOVACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO DE LA ASOCIACIÓN URBANIZADORA, SAN PEDRO DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA", CUI 2527333,** y solicita se derive de manera urgente a la Gerencia de Asesoría Jurídica para su aprobación mediante su acto resolutivo.

Que, mediante **Informe N° 140-2023-GAJ-MDAA de fecha 08 de marzo 2023**, la Gerencia de Asesoría Jurídica dentro de las atribuciones que le compete en materia legal, es de **OPINIÓN** PROCEDENTE aprobar AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03 de la IOARR denominada: **"RENOVACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO DE LA ASOCIACIÓN URBANIZADORA SAN PEDRO, DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA", con CUI N° 2527333,** por 127 días calendarios, resultando un plazo total reprogramado por 233 días calendarios, teniendo como nueva fecha de culminación el 12 de mayo del 2023, en mérito al Informe N° 030-2023-LCJI-IO-SGSLI-GM/MDAA y el Informe N° 275-2023-DLQ-SGSLI-GM-MDAA/TACNA.

Que, mediante el **PROVEÍDO N° 1716-2023-GM-MDAA** de fecha 09 de marzo del 2023, el Gerente Municipal remite el Expediente a la Gerencia de Asesoría Jurídica, **AUTORIZANDO** para proyectar Acto Resolutivo

Estando a la delegación de facultades conferida mediante Resolución de Alcaldía N° 009-2023-A-MDAA, a la Constitución Política del Perú, Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; al Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N°

27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, Directiva N° 001-2019-EF/63.01; y, contando con el Visto Bueno de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Desarrollo Urbano, Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Inversiones;

**SE RESUELVE:**

**Artículo Primero: APROBAR**, la **AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03** de intervención de la "IOARR: **"RENOVACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO DE LA ASOCIACIÓN URBANIZADORA SAN PEDRO, DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA", con CUI Nº 2527333,** por **127 días calendarios**, resultando un plazo total reprogramado por **233 días calendarios**, teniendo como nueva fecha de culminación **el 12 de mayo del 2023,** en mérito al Informe N° 030-2023-LCJI-IO-SGSLI-GM/MDAA, el Informe N° 275-2023-DLQ-SGSLI-GM-MDAA/TACNA y conforme el **Cuadro de Resumen** de la Ampliación de Plazo N° 03 y la **Nueva Ruta Crítica**, como sigue:

| ITEM | ORIGEN | DURACIÓN |
|---|---|---|
| 1 | Tiempo Programado según Expediente Técnico | 60 días |
| 2 | **Ampliación de Plazo Nº 01** | **27 días** |
| 3 | **Ampliación de Plazo Nº 02** | **19 días** |
| 4 | **Ampliación de Plazo Nº 03** | **127 dias** |
| | **TIEMPO TOTAL INCLUYENDO LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03** | **233 DÍAS** |

**Nueva Ruta Crítica**

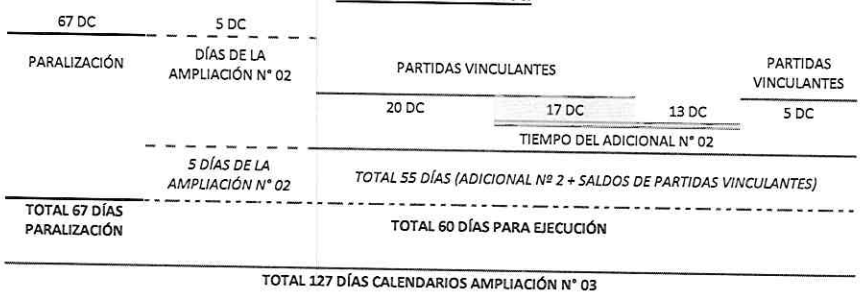


**Artículo Segundo: AUTORIZAR** a la UEI- Gerencia de Desarrollo Urbano, Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Inversiones, Residente e Inspector de la Obra cumplir irrestrictamente la ejecución física de la Obra en el plazo aprobado, así como cautelar la entrega y aprobación oportuna del Informe Final y Recepción de la Obra, evitando dilaciones y sobre costos, de acuerdo a los parámetros y especificaciones técnicas contempladas en el Expediente Técnico y Normatividad contemplada en la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Resolución de Contraloría N° 195-88-CG; y, Directiva N° 07-2020-A-MDAA-TACNA aprobado mediante la Resolución de Alcaldía N° 244-2012-A-MDAA-TAC, en observancia estricta a lo señalado en las disposiciones el invierte.pe.

**Artículo Tercero: ENCARGAR** a la UEI-Gerencia de Desarrollo Urbano el registro actualizado en el banco de Inversiones conforme a lo establecido en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones; así como a nivel de INFOBRAS y otros.

**Artículo Cuarto: ENCARGAR** la custodia del Expediente Técnico Físico y Digital a la Sub Gerencia de Obras y mantenimiento; Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Inversiones, quienes deberá además custodiar las modificaciones al Expediente Técnico y toda documentación propia de la ejecución.

**Artículo Quinto: DISPONER** la notificación de la presente resolución al interesado, a las unidades orgánicas correspondientes, con las formalidades establecidas por Ley.

**Artículo Sexto: ENCARGAR** a la Sub Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicación para su publicación en el portal web de la entidad (www.munialtoalianza.gob.com).

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA**

**Abog. AURELIANO GUTIERREZ AYCA**
**Gerente Municipal**

*C.C.*
*GM*
*GAJ*
*GDU*
*SGOM*
*SGSLI*
*SGSG*
*SGTIC*
*INTERESADO*
*ARCHIVO*
